

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

Nº SAP: 5900130281



Encarregado: José Domingos Soares

DATA: 21/07/2026

Equipe: Serventes

DIA DA SEMANA

TEMPO

Distrito: Marabá

() DOM () SEG (X) TER () QUA

SOL () CHUVA


Local da atividade: Km 767+520 ao 770+480

() QUI () SEX () SAB

HORÁRIO		ITEM	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES	UNID	QUANTIDADE	KM		MÃO DE OBRA DIRETA / INDIRETA
INICIAL	FINAL					INICIAL	FINAL	
07:00	08:50		Deslaramento para o Km 767+520.					(1) ENCARREGADO
08:50	09:50		Montagem da área de vivência, abastecimento água DVS					(1) TÊC. DE SEG. DO TRABALHO
								(1) MOTORISTA CAT. B / D
								() SINALEIRO
								(2) PEDREIRO
								(1) SERVENTE DE OBRAS
09:50	12:00		Parauspô de atividade.					
12:00	13:00		Almoo					
13:00	17:00		Execução de atividade					(7) ROÇADEIRA
			Manutenção em corte Km 767+530 ao 770+480 l.c.					(3) MOTOPODA
		2.2.1	Raço em corte:					(2) ÁREA DE VIVÊNCIA
			1º ponto (264x12=3168 m²)	m²	3168			(1) MICRO-ÔNIBUS
			2º ponto (228x3=684 m²)	m²	684			(2) BANHEIRO QUÍMICO
								() VEÍCULO LEVE
								() PICK-UP CABINE DUPLA
								() CAMINHÃO 3/4
								() VAN
			OM 202601903987. Em andamento					
OBSERVAÇÕES ENGECOM				OBSERVAÇÕES VALE				

Manutenção em corte Km 767+530
do 770+480. LE. (21/07/2026).

OM 202601901987.

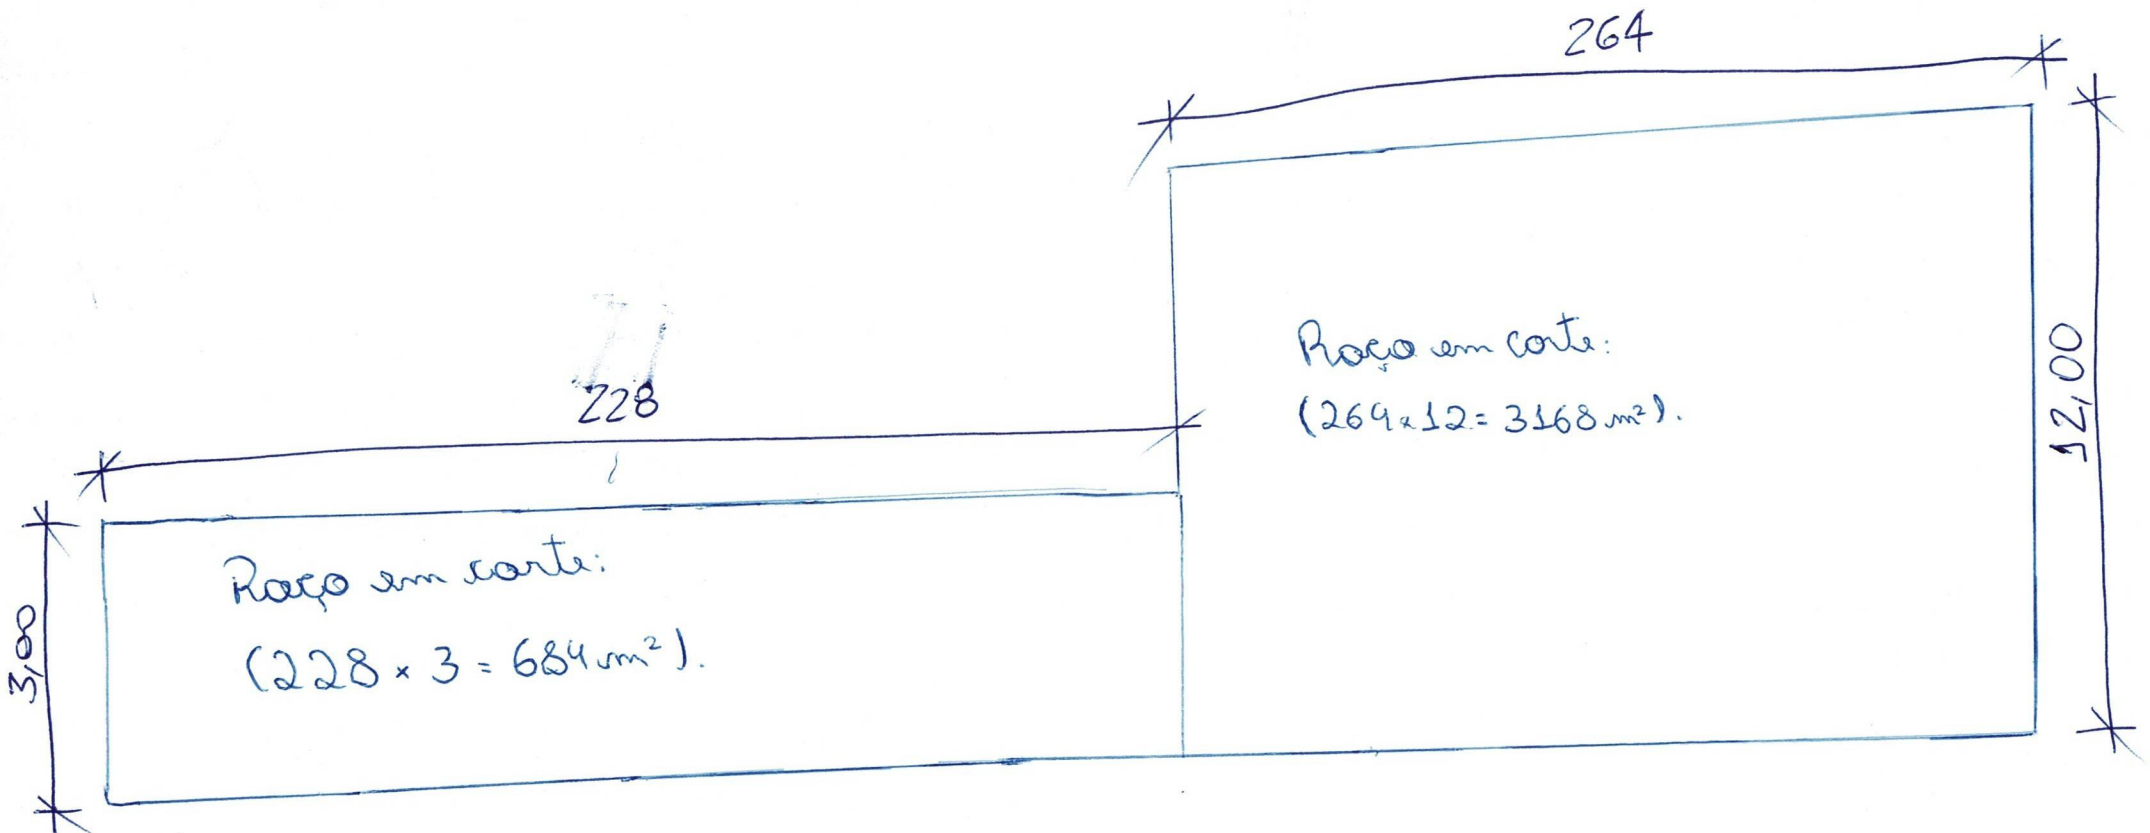

Nº SAP: 5900130281



Encargado:	José Domingo Lopez
------------	--------------------

DATA:	22/07/2026
-------	------------

Equipe:	Reservistas
---------	-------------

DIA DA SEMANA

Distrito: Morales

() DOM	() SEG	() TER	(x) QUA
---------	---------	---------	---------

Local da atividade: Km 267, 530 00 770 + 480

() QUI	() SEX	() SAB
---------	---------	---------

TEMPO

☒ SOL ☐ CHUVA

HORÁRIO		ITEM	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES	UNID	QUANTIDADE	KM		MÃO DE OBRA DIRETA / INDIRETA
INICIAL	FINAL					INICIAL	FINAL	
07:30	09:00		Deslocamento para o Km 767+530.			767+530	770+480	(1) ENCARREGADO
09:00	9:35		Montagem da área de vivência, OSS, documentações e explicações sobre o CRM.					(1) TÊC. DE SEG. DO TRABALHO
								(1) MOTORISTA CAT. B / D
								(1) SINALEIRO
								(2) PEDREIRO
								(1) SERVENTE DE OBRAS
09:35	12:00		Atividade.					
12:00	13:00		Almoço.					
13:00	17:00		Atividade.					
			Manutenção em corte Km 767+530 ao 770+480 LE.					
		2.2.1	Rorç (1040x3=3520m ²).	m ²	3120			(1) ROÇADEIRA
								(3) MOTOPODA
								(2) ÁREA DE VIVÊNCIA
								(1) MICRO-ÔNIBUS
								(2) BANHEIRO QUÍMICO
								(1) VEÍCULO LEVE
								(1) PICK-UP CABINE DUPLA
								(1) CAMINHÃO 3/4
								(1) VAN
			OM 202601901987. Em andamento					

OBSERVAÇÕES ENGECOM

OBSERVAÇÕES VALE

Um servente dando apoio para a equipe de terraço plano gen.

SE NÃO FOR SEGURO, NÃO FAÇA

ENGECON ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
Responsável ENGECON: Jose Domingos Lopes
Encarregado de Obra Civil
Matrícula: 19393

Responsável VALE:

Geowana Sousa
Técnica Infraestrutura
Mat.: 81061116
VALE E EFC

22/07/2026

Manutenção em corte
Km 769+530 ao 770+480 LE.

OM 202601901987.

Raço em corte:
(1040 x 3 = 3120 m²).

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

Nº SAP: 5900130281



Encarregado: Jose Domingos Lopes
 Equipe: servente
 Distrito: marabá
 Local da atividade: Km 767+530 ao 770+480

DATA: 23/07/2026

DIA DA SEMANA
 () DOM () SEG () TER () QUA
 (x) QUI () SEX () SAB

TEMPO
 (x) SOL () CHUVA

HORÁRIO		ITEM	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES	UNID	QUANTIDADE	KM		MÃO DE OBRA DIRETA / INDIRETA
INICIAL	FINAL					INICIAL	FINAL	
07:00	08:40		Deslaramento para o Km 767+530.					(1) ENCARREGADO
09:20	09:50		Manutenção da área de vivência DSS e Documentação.					(1) TÊC. DE SEG. DO TRABALHO
								(1) MOTORISTA CAT. B / D
								() SINALEIRO
								(2) PEDREIRO
								(6) SERVENTE DE OBRAS
09:50	12:00		Execução de atividade.					
12:00	13:00		Almoço.					
13:00	17:00		Execução de atividade.					
			Manutenção em corte Km 767+530 ao 770+480 LE.					
		2.2.1	Raio em corte (1103 x 3 = 3309 m²)	m²	3309			(1) ROÇADEIRA
								(3) MOTOPODA
								(2) ÁREA DE VIVÊNCIA
								(1) MICRO-ÔNIBUS
								(2) BANHEIRO QUÍMICO
								() VEÍCULO LEVE
								() PICK-UP CABINE DUPLA
								() CAMINHÃO 3/4
								() VAN
		2.1.5	Limpeza de meio fio: Comp 116 m; larg 25 cm; alt 14 cm.	m	116			
			Pintura de meio fio (47 x 0,13 = 6,11 m²)	m²	6,11			
OBSERVAÇÕES ENGECON				OBSERVAÇÕES VALE				
OM 202601 9019 87 em andamento.								
Ativado na mobilização da parte de serviço devido a uniões ERES ter sido após para equipe continue para de trabalho de conclusão de obra cobertura.								
A extensão do terreno vai incluindo corte e aterro.								
Realizar de trabalho obtendo drenagem (meio fio).								
SE NÃO FOR SEGURO, NÃO FAÇA								

ENGECON ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA
 Responsável ENGECON: Jose Domingos Lopes
 Encarregado de Obra Civil
 Matrícula: 19393

Responsável VALE:

Geowana Sousa
 Geowana Sousa
 Técnica Infraestrutura
 Mat.: 81061116
 VALE E EFC

Manutenção em corte

23/07/2026

Km 767+530 ao 770+480 LE.

OM 2026019087.

Rolo em corte:
(1103 x 3 = 3309 m²)

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

Nº SAP: 5900130281



Encarregado: José Domingos Lopes
 Equipe: Servente de Obras
 Distrito: Marabá
 Local da atividade: Km 783+350 ao 784+200

DATA: 29/07/2026

DIA DA SEMANA
 () DOM () SEG () TER () QUA
 () QUI (X) SEX () SAB

TEMPO
 (X) SOL () CHUVA

HORÁRIO		ITEM	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES	UNID	QUANTIDADE	KM		MÃO DE OBRA DIRETA / INDIRETA
INICIAL	FINAL					INICIAL	FINAL	
07:00	08:50		Deslocamento para o Km 783+520					() ENCARREGADO
08:50	09:20		Manutenção da área de vivência, 055 m					(X) TÊC. DE SEG. DO TRABALHO
			Documentação.					(X) MOTORISTA CAT. B / D
09:20	12:00		Execução de atividade.					() SINALEIRO
12:00	13:00		Almoço.					(X) PEDREIRO
13:00	16:00		Execução de atividade.					(X) SERVENTE DE OBRAS
			Manutenção em aterro Km 783+350 ao					
			784+200.					
		2.2.1	Raspagem em aterro em descidas de água:					
			1ª descida (12 x 5 x 2 = 25 m³)	m³	25			() ROÇADEIRA
			2ª descida (12 x 2 = 24 m³)	m³	24			(X) MOTOPODA
		2.2.1	Raspagem em aterro:					(X) ÁREA DE VIVÊNCIA
			1º ponto (754 x 2,5 = 1885 m²)	m²	1885			(X) MICRO-ÔNIBUS
			2º ponto (106 x 4 = 424 m²)	m²	424			(X) BANHEIRO QUÍMICO

OBSERVAÇÕES ENGECON

OBSERVAÇÕES VALE

SE NÃO FOR SEGURO, NÃO FAÇA

ENGECON ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA
 Responsável ENGECON: José Domingos Lopes
 Encarregado da Obra Civil
 Matrícula: 19393

Responsável VALE: Geowana Sousa
 Geowana Sousa
 Técnica Infraestrutura
 Mat.: 81061116
 VALE E EFC

Nº SAP: 5900130281



Equipe:

Distrito:

Local da atividade:

DATA:

29/07/2026

DIA DA SEMANA

TEMPO

()S

() CHUVA

() QUI

() SEX

() SAE

KM

MÃO DE OBRA DIRETA / INDIRETA

() ENCARREGADO

() T C. DE SEG. DO TRABALHO

() MOTORISTA CAT. B / D

☐ SINALEIRO

() PEDREIRO

() SERVENTE

[illegible]

OUTROS CUSTOS INDIRETOS

☐ ROÇADEIRA

() MOTPODA

() ÁREA DE VIVÊNCIA

☐ MICRO-ÔNIBUS☐ BANHEIRO QUÍMICO☐ VEÍCULO LEVE

() PICK-UP CABINE DUPLA	
--------------------------	--

() CAMINHÃO 3/4

() VAN

OBSERVAÇÕES ENGECOM

OBSERVAÇÕES VALE

SE NÃO FOR SEGURO, NÃO FAÇA

Responsável ENGECOM: **José Domingos Lopes**
Encarregado de Obra Civil
Matrícula: 19393

Responsável VALE:

Geowana Sousa
Técnica Infraestrutura
Mat.: 81061116
VALE E EFC

24/07/2026.

Manutenção em aterro

Km 783+350 ao 784+200 LE.

OM 202601912340.

2º Ponto:

$$(306 \times 4 = 424 \text{ m}^2)$$

1º Ponto:

$$(754 \times 2,5 = 1885 \text{ m}^2)$$

$$(12 \times 2 = 24 \text{ m}^2)$$

$$(12,5 \times 2 = 25 \text{ m}^2)$$

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA



Encargado: José Domingo López

Equipe:	Preventivo
---------	------------

Distrito:	maral
-----------	-------

Local da atividade:	CPI 232
---------------------	---------

DATA:	27/07/2026
-------	------------

DIA DA SEMANA

TEMPO

() DOM	(☒) SEG	() TER	() QUA
---------	---	---------	---------

() QUI	() SEX	() SAB
---------	---------	---------

(☒) SOL () CHUVA

Nº SAP: 5900130281

[illegible]

SE NÃO FOR SEGURO, NÃO FAÇA

Responsável ENGECON:

ENCOM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA
José Domingos Lopes
Encarregado de Obra Civil
Matrícula: 19393

Responsável VAE

E: Geowana Sousa
Geowana Sousa
Técnica Infraestrutura
Mat.: 81061116
VALE E EFC

27/07/2026

Manutenção em corte; Km

2132 ao 2401 LE, pato COT. L32.

OM 202601908354.

Razo em corte:

$$(269 \times 3 = 807 \text{ m}^2).$$

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

Nº SAP: 5900130281



Encarregado: José Domingos Soares

DATA: 28/07/2026

Equipe: Preventivo

DIA DA SEMANA

TEMPO

Distrito: Marabá

() DOM () SEG (X) TER () QUA

(X) SOL () CHUVA

Local da atividade: COI

() QUI () SEX () SAB

HORÁRIO		ITEM	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES	UNID	QUANTIDADE	KM		MÃO DE OBRA DIRETA / INDIRETA
INICIAL	FINAL					INICIAL	FINAL	
07:30	07:30		Deslocamento para a COI					(1) ENCARREGADO
07:30	08:00		Manutenção da área de vivência					(1) TÊC. DE SEG. DO TRABALHO
			DSS - documentação.					(1) MOTORISTA CAT. B / D
								() SINALEIRO
08:00	12:00		Execução de atividade					(2) PEDREIRO
12:00	13:00		Almoço.					(1) SERVENTE DE OBRAS
13:00	17:00		Execução de atividade					
			Manutenção em corte, Km 2336 ao 2403,					OUTROS CUSTOS INDIRETOS
			no patio COI L32.					(7) ROÇADEIRA
		2.2.1	Piso em corte:					(3) MOTOPODA
			1º ponto (225 x 3 = 675 m²)	m²	675			(2) ÁREA DE VIVÊNCIA
			2º ponto (42 x 4 = 168 m²)	m²	160			(1) MICRO-ÔNIBUS
								(2) BANHEIRO QUÍMICO
			manutenção em corte, Km 2443 ao 2037					() VEÍCULO LEVE
			no patio COI L32.					() PICK-UP CABINE DUPLA
								() CAMINHÃO 3/4
								() VAN
OBSERVAÇÕES ENGECON				OBSERVAÇÕES VALE				
OM 202601908353. Conclusão.								
OM 202601908354. Conclusão.								
OM 202601908351. Conclusão.								
Consumo de material: 6 sacos de cimento; 1 saco de								
cimento e 2 carrinhos de areia.								

SE NÃO FOR SEGURO, NÃO FAÇA

ENGECON ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA
 Responsável ENGECON: José Domingos Lopes
 Encarregado de Obra Civil
 Matrícula: 19393

Responsável VALE:


Geowana Sousa
 Geowana Sousa
 Técnica Infraestrutura
 Mat.: 81061118
 VALE E EFC

28/07/2026

Manutenção em corte
Km 2136 ao 2403 LO, CDI.

OM 202601908356.

Raço em corte

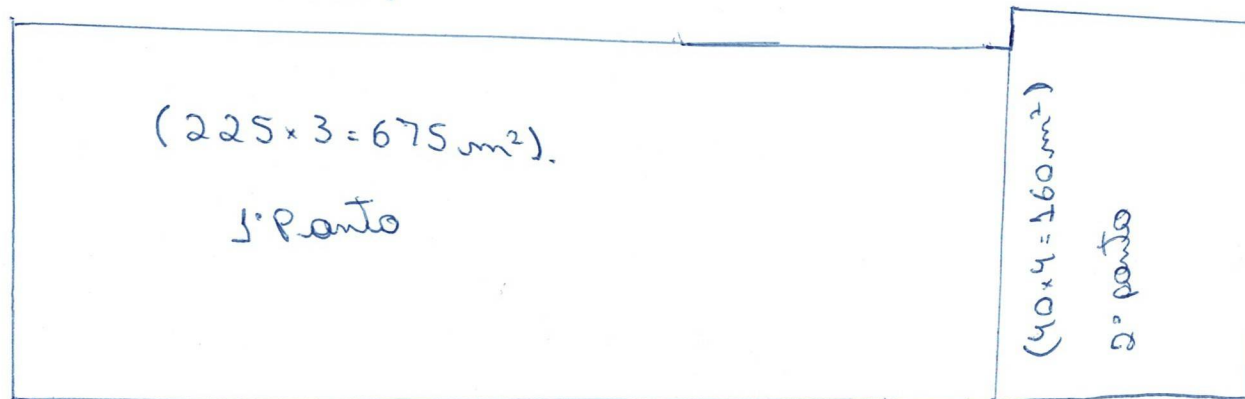

Manutenção em corte

Km 1541 ao 2037/E.CDI

28/01/2026

OM 202601908351.

Razo em corte

$$(108 \times 3 = 324 \text{ m}^2).$$

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

Nº SAP: 5900130281



Encarregado: Jose Domingos Lopes
 Equipe: servente
 Distrito: Marabá
 Local da atividade: Km 772+300 ao 772+780

DATA: 29/07/2026

DIA DA SEMANA
 () DOM () SEG () TER (X) QUA
 () QUI () SEX () SAB

TEMPO
 (X) SOL () CHUVA

HORÁRIO		ITEM	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES	UNID	QUANTIDADE	KM		MÃO DE OBRA DIRETA / INDIRETA
INICIAL	FINAL					INICIAL	FINAL	
07:00	08:40		Declaramento para o Km 772+300.					(1) ENCARREGADO
08:40	09:10		Montagem de área de vivência, OSU e documentos.					(1) TÉC. DE SEG. DO TRABALHO
								(1) MOTORISTA CAT. B / D
								() SINALEIRO
								(2) PEDREIRO
								(10) SERVENTE DE OBRAS
09:10	12:00		Exercícios de aturidade					
12:00	13:00		Almoço.					OUTROS CUSTOS INDIRETOS
13:00	17:00		Exercícios de aturidade.					(1) ROÇADEIRA
								(3) MOTOPODA
								(2) ÁREA DE VIVÊNCIA
								(3) MICRO-ÔNIBUS
								(2) BANHEIRO QUÍMICO
								() VEÍCULO LEVE
								() PICK-UP CABINE DUPLA
								() CAMINHÃO 3/4
								() VAN
		2.2.2	Roca em corte (480x5=2400 m²)	m²	2400			

Manutenção em corte.

Km 772+300 ao 772+780 LO.

29/07/2026

OM 202601977431.

Roco em corte:

$$(480 \times 5 = 2400 \text{ m}^2).$$

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

Nº SAP: 5900130281



Encarregado: Jose Domingos Lopes
 Equipe: Vereadores
 Distrito: Marabá
 Local da atividade: CDI L12

DATA: 30/07/2026

DIA DA SEMANA

TEMPO

() DOM () SEG () TER () QUA
 (X) QUI () SEX () SAB

☒ SOL () CHUVA

HORÁRIO		ITEM	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES	UNID	QUANTIDADE	KM		MÃO DE OBRA DIRETA / INDIRETA
INICIAL	FINAL					INICIAL	FINAL	
07:20	08:30		Deslocamento para o CDI.					(1) ENCARREGADO
10:30	11:00		Montagem de arcos de umidade. DSS e documentações.					(1) TÊC. DE SEG. DO TRABALHO
								(1) MOTORISTA CAT. B / D
								() SINALEIRO
								(2) PEDREIRO
								(5) SERVENTE DE OBRAS
11:00	12:00		Verificação do aturo com Paulo e Geovane.					
12:00	13:00		Almoco.					OUTROS CUSTOS INDIRETOS
13:00	17:00		Cuicuas de atividade.					(1) ROÇADEIRA
			Manutenção em corte, Km 2436 ao 240510					(2) MOTOPODA
			patro CDI L12.					(2) ÁREA DE VIVÊNCIA
		2.1.5	Limpeza de sarjeta triangular: Camp					(1) MICRO-ÔNIBUS
			158,7 m; larg 7,5 m, alt 30 cm.	m	158,7			(2) BANHEIRO QUÍMICO
								() VEÍCULO LEVE
								() PICK-UP CABINE DUPLA
								() CAMINHÃO 3/4
								() VAN
		2.2.5	Remoção de solo: Camp 158,7; alt 18 cm, 1:1 m					(2) Saprada.
			(158,7 x 0,18 x 1 = 28,566 m³)	m³	28,566			
OBSERVAÇÕES ENGECON				OBSERVAÇÕES VALE				
OM 2026 01908356. Em andamento.								
Atuação no deslocamento para parte de serviço de arcos manifestar-se no BR-155.								

SE NÃO FOR SEGURO, NÃO FAÇA

ENGECON ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA
 Responsável ENGECON: Jose Domingos Lopes
 Encarregado de Obra Civil
 Matrícula: 19393

Responsável VALE:

Geovana Sousa
 Geovana Sousa
 Técnica Infraestrutura
 Mat.: 81061116
 VALE E EFC

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

Nº SAP: 5900130281



Encarregado: Jose Domingos Soares
 Equipe: Preventiva
 Distrito: Marabá
 Local da atividade: CD 1, L12

DATA: 31/07/2026

DIA DA SEMANA

TEMPO

() DOM () SEG () TER () QUA

(X) SOL

() CHUVA

() QUI (X) SEX () SAB

KM

INICIAL

FINAL

MÃO DE OBRA DIRETA / INDIRETA

(1) ENCARREGADO
 (1) TÊC. DE SEG. DO TRABALHO
 (1) MOTORISTA CAT. B / D
 () SINALEIRO
 (2) PEDREIRO
 (3) SERVENTE DE OBRAS

OUTROS CUSTOS INDIRETOS

(7) ROÇADEIRA
 (3) MOTOPODA
 (2) ÁREA DE VIVÊNCIA
 (1) MICRO-ÔNIBUS
 (2) BANHEIRO QUÍMICO
 () VEÍCULO LEVE
 () PICK-UP CABINE DUPLA
 () CAMINHÃO 3/4
 () VAN

HORÁRIO		ITEM	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES	UNID	QUANTIDADE	KM		
INICIAL	FINAL					INICIAL	FINAL	
07:30	07:30		Deslocamento para o CD 1.					
07:30	08:00		Montagem de área de vivência, DSS e documentações					
08:00	12:00		Exercício de atividade.					
12:00	13:00		Almoço.					
13:00	17:00		Exercício de atividade.					
			Manutenção em corte, Km 2136 ao 2401 LD					
			por Tiro CD 1 L12.					
		2.1.5	Limpeza de 72,3 m de sarjeta triangular.	m	72,3			
			Pintura de meio fio (231 x 0,10 = 23,1 m²)	m²	23,1			
		2.2.5	Remoção de sola (7 x 1 x 0,2 = 1,4 m³)	m³	1,4			
		2.1.8	Recuperação de 33 m de sarjeta.	m	33			

OBSERVAÇÕES ENGECOM

OBSERVAÇÕES VALE

OM 202601908356. Cancelado.
 OM 202601908354. Cancelado.

Consumo de material: 2 pacotes de cimento, 2,5 sacos de cimento e 5 carrinhos de areia.

SE NÃO FOR SEGURO, NÃO FAÇA

Responsável ENGECOM: ENGECOM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA
Jose Domingos Soares
 Encarregado de Obra Civil
 Matrícula: 19393

Responsável VALE:

Geovana Sousa
 Geovana Sousa
 Técnica/Infraestrutura
 Mat.: 81061116
 VALE E EFC

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

Nº SAP: 5900130281



Encarregado:

Equipe:

Distrito:

Local da atividade:

DATA:

31/07/2026

DIA DA SEMANA

TEMPO

() DOM () SEG () TER () QUA

() SOL () CHUVA

() QUI () SEX () SAB

HORÁRIO

INICIAL

FINAL

ITEM

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

UNID

QUANTIDADE

KM

INICIAL

FINAL

MÃO DE OBRA DIRETA / INDIRETA

() ENCARREGADO

() TÉC. DE SEG. DO TRABALHO

() MOTORISTA CAT. B / D

() SINALEIRO

() PEDREIRO

() SERVENTE DE OBRAS

OUTROS CUSTOS INDIRETOS

() ROÇADEIRA

() MOTOPODA

() ÁREA DE VIVÊNCIA

() MICRO-ÔNIBUS

() BANHEIRO QUÍMICO

() VEÍCULO LEVE

() PICK-UP CABINE DUPLA

() CAMINHÃO 3/4

() VAN

OBSERVAÇÕES ENGECON

OBSERVAÇÕES VALE

SE NÃO FOR SEGURO, NÃO FAÇA

ENGECON ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA
 Responsável ENGECON: José Domingos Lopes
 Encarregado de Obra Civil
 Matrícula: 19393

Responsável VALE:

Geowana Sousa
 Técnica Infraestrutura
 Mat.: 81061116
 VALE E EFC
